



بلدية رواد

المخطط الاستثماري التشاركي لبلدية رواد لسنة 2019

التشخيص الفني



بطاقة تعريف بلدية رواد



- 1 - تاريخ الإحداث: 24 فيفري 2003
 - 2 - المساحة دون اعتبار منطقة التوسع : 7500 هكتار.
 - 3- المساحة باعتبار منطقة التوسع : 10500 هكتار.
 - 4- عدد السكان دون اعتبار منطقة التوسع : 106 أن.
 - 5- عدد السكان باعتبار منطقة التوسع : 145 أن.
 - 6- عدد الأسر دون اعتبار منطقة التوسع : 33000 أسرة.
 - 7- عدد الأسر باعتبار منطقة التوسع : 45000 أسرة.
 - 8- عدد المساكن دون اعتبار منطقة التوسع : 33000 مسكن
 - 9- عدد المساكن باعتبار منطقة التوسع : 45000 مسكن
- الحدود :**
- شمالا: البحر الأبيض المتوسط.
 - شرقا: سبخة أريانة و بلدية سكرة.
 - غربا: بلدية قلعة الأندلس.
 - جنوبا: بلدية اريانة.



المشاريع المتواصلة
للبنية التحتية
2018-2016
بلدية رواد



مشروع تعبيد الطرقات المدرج ضمن الميزانية التشاركية لسنة 2016

- الكلفة النهائية: 1.727.000 د
- مدة الإنجاز: 240 يوما.
- نسبة الإنجاز: 100 % .
- قائمة الأنهج حسب المناطق:

| المنطقة | النهج |
|---------------------------|---|
| الغزاة | ❖ نهج العدالة ❖ نهج دجبة ❖ نهج تمامة |
| النخيلات و أرنة الصغرى | ❖ نهج العثمانيين ❖ نهج الهضاب ❖ نهج الواحات |
| سيدي عمر | ❖ نهج توفيق بن هلال ❖ نهج الزهراء ❖ نهج صفية بن فرحات |



| | |
|--|-------------|
| ❖ نهج المغفرة ❖ نهج العشب ❖ نهج المعارف | جعفر |
| ❖ نهج قرطاجنة ❖ نهج علي بلاغة ❖ نهج طنجة | رواد الشاطئ |

مشروع تعبيد الطرقات المدرج ضمن البر مج الإستثماري التشاركي لسنة 2016

- الكلفة النهائية: 1.274.000 د
- مدة الإنجاز: 240 يوما.
- نسبة الإنجاز: 100 % .
- قائمة الأنهج حسب المناطق:

| المنطقة | النهج |
|---------|---|
| الغزالة | ❖ نهج البهجة ❖ نهج قوس قزح ❖ جزء من نهج الحديقة ❖ نهج سوسة (تعبيد و تنوير) ❖ نهج عمار الدخلاوي (صيانة) ❖ نهج أحمد ابن أبي داوود (صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار) ❖ نهج بنزرت (تنوير) |



النخيلات

- ❖ نهج الإمتياز (صيانة لطبقة الإسفلتية)
- ❖ نهج الشعراء (صيانة لطبقة الإسفلتية)
- ❖ نهج فتحية خيرى

أرنة الصغرى

- ❖ نهج ابن حزم
- ❖ نهج مالك ابن أنس
- ❖ نهج أبو لبابة الأنصاري
- ❖ نهج الإمام الشافعي
- ❖ نهج خير الدين شا
- ❖ نهج عمار ابن سر
- ❖ نهج موسى ابن نصير
- ❖ تقاطع نهجي رابعة العدوية و خالد ابن الوليد
- ❖ نهج الإمام ابن حنبل
- ❖ نهج حسان ابن نعمان
- ❖ نهج المنجي سليم (صيانة شبكة التنوير العمومي)
- ❖ نهج الإمام الشافعي و تفرعاته (صيانة شبكة التنوير العمومي)
- ❖ نهج محرز ابن خلف (صيانة شبكة التنوير العمومي)
- ❖ نهج مالك ابن أنس (صيانة شبكة التنوير العمومي).



❖ تدريج الطريق الرابط بين حي اليمامة و حي المقبرة سيدي عمر

❖ نهج خنيس (تعبيد و تنوير) جعفر

❖ نهج الز تين

❖ نهج غرة ماي

❖ نهج الكرم

❖ نهج الوادي

❖ نهج الد غين

❖ نهج الهادي المسكي (صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار)

❖ نهج الهادي بوبكر (تنوير)

❖ نهج ما شو رواد الشاطئ

❖ النهج الرابط بين نهج الأمومة و نهج الإخاء و جزء من نهج الإخاء

❖ نهج أولاد سلامة



مشروع تعبيد الطرقات المدرج ضمن البر مج الإستثماري التشاركي لسنة 2017

- مبلغ الصفقة: 2.681.000 د (قسطين)
- مدة الإنجاز: 270 يوما.
- نسبة الإنجاز: 5 %.
- قائمة الأنهج حسب المناطق:

| المنطقة | النهج |
|----------|---|
| الغزالة | ❖ نهج نعمان بن بت ❖ نهج التجديد ❖ نهج الفصاحة (البلاغة) ❖ نهج البرتقال |
| النخيلات | ❖ نهج القرنفل ❖ نهج الأمويين ❖ نهج الزيتون ❖ نهج عبد الملك المهري |



أرنة الصغرى

- ❖ نهج الكروان
- ❖ نهج الشحرور
- ❖ نهج البشير صفر
- ❖ نهج عقبة بن فع
- ❖ نهج ابو هريرة
- ❖ نهج عبد العزيز الثعالبي
- ❖ نهج الكناري
- ❖ نهج العندليب
- ❖ نهج سيدي عمار

| المنطقة | النهج |
|----------|--|
| سيدي عمر | <ul style="list-style-type: none">❖ نهج الخوخ و نهج 13 أوت❖ نهج الخوخ (تنوير)❖ نهج الملاحة تنوير (الجزء المتبقي)❖ نهج العوينة❖ نهج حب الملوك❖ نهج العنب |



| | |
|---|-------------|
| ❖ نهج صيادة ❖ نهج الخزامة و تفرعاته ❖ نهج الليمون ❖ نهج الزيزفون ❖ نهج جمال | جعفر |
| ❖ نهج قلبية ❖ نهج دار شعبان ❖ نهج بوعرقوب ❖ نهج الأجوار ❖ نهج الحلفاوين | رواد الشاطئ |

مشروع تعبيد الطرقات المدرج ضمن البر مج الإستثماري التشاركي لسنة 2018

- الكلفة التقديرية: 2.600.000 د
- مدة الإنجاز: 270 يوما.
- مرحلة الإنجاز: في طور طلب العروض.
- قائمة الأنهج حسب المناطق:



| المنطقة | النهج |
|----------|---|
| الغزاة | <ul style="list-style-type: none">❖ نهج فولتار.❖ نهج مونتسكيو.❖ نهج الطموح.❖ نهج بحر الجاوا.❖ نهج هونري سعادة. |
| النخيلات | <ul style="list-style-type: none">❖ نهج المدينة (صيانة).❖ نهج الحق.❖ نهج بحر القزوين.❖ نهج ماجلان.❖ نهج الينايع.❖ نهج ابن خلفون. |



| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">❖ نُهْج الحبيب مر (صيانة).❖ نُهْج فاطمة الزهراء (صيانة).❖ نُهْج الإمام أبو حنيفة.❖ نُهْج اليا أبو ماضي.❖ نُهْج سيدي بو علي السني.❖ نُهْج الطاهر الحداد (صيانة). | <ul style="list-style-type: none">• أرنة الصغرى |
| <ul style="list-style-type: none">❖ نُهْج ابن الهيثم.❖ نُهْج الجزري.❖ النهج المؤدي للمقبرة.❖ نُهْج موازي لنهْج برج الوزير. | سيدي عمر |
| <ul style="list-style-type: none">❖ زنقة الفراي.❖ زنقة عدد 5805.❖ نُهْج المنبت.❖ نُهْج يحيى التركي.❖ نُهْج الإحترام.❖ نُهْج الفراولو. | جعفر |



رواد الشاطئ

- ❖ نهج سيدي عبد .
- ❖ نهج التوهامي بوطبة.
- ❖ نهج الرمان.
- ❖ نهج الهادي الجويني.
- ❖ نهج الطاقة.

برمج تصيير الطرقات لسنة 2018

- الكلفة: 2.646.000 د
- نسبة الإنجاز: 100 %.
- قائمة الأنهج حسب المناطق:

| المنطقة | النهج |
|---------|---|
| الغزالة | <ul style="list-style-type: none">❖ شارع الحبيب بورقيبة.❖ نهج صدر بعل.❖ نهج حسان بلخوجة.❖ نهج عمار الدخلاوي.❖ نهج محمد البراهمي.❖ نهج الأنصار.❖ نهج مسلم بن الوليد.❖ نهج أفلاطون.❖ نهج الثقافة. |



| | |
|---------------------------|--------------|
| ❖ نهج علي بن جاب . | لغزاة |
| ❖ نهج جواهر آل نھرو. | |
| ❖ نهج عمر بن عبد العزيز. | |
| ❖ نهج أحمد ابن أبي داوود. | |
| ❖ جزء من شارع الدوحة. | |
| ❖ نهج أبو شرف القيرواني. | |
| ❖ نهج جبل الشعانبي. | |
| ❖ نهج شكيب أرسلان. | |
| ❖ نهج الصديق. | |
| ❖ نهج سقراط. | |
| ❖ نهج غاندي. | |
| ❖ نهج الصفصاف. | |
| ❖ نهج النخيلات. | النخيلات |
| ❖ نهج حمزة بن عبد المطلب | أر نة الصغرى |

مشاريع التهذيب ببلدية رواد





برمج تهذيب و إدماج الأحياء السكنية

I. مشروع تهذيب حي عيشوشة و حي المطار:

- الكلفة: 9.800.000 د (يشمل التدخل لطرق، التنوير العمومي، الربط بمختلف الشبكات، تحسين السكن و إنجاز تجهيزات جماعية)
- مدة الإنجاز: 542 يوما.
- نسبة الإنجاز: 85%.
- الموقع:

مستخرج من مثال التهيئة العمرانية لبلدية رواد يبين منطقة التدخل

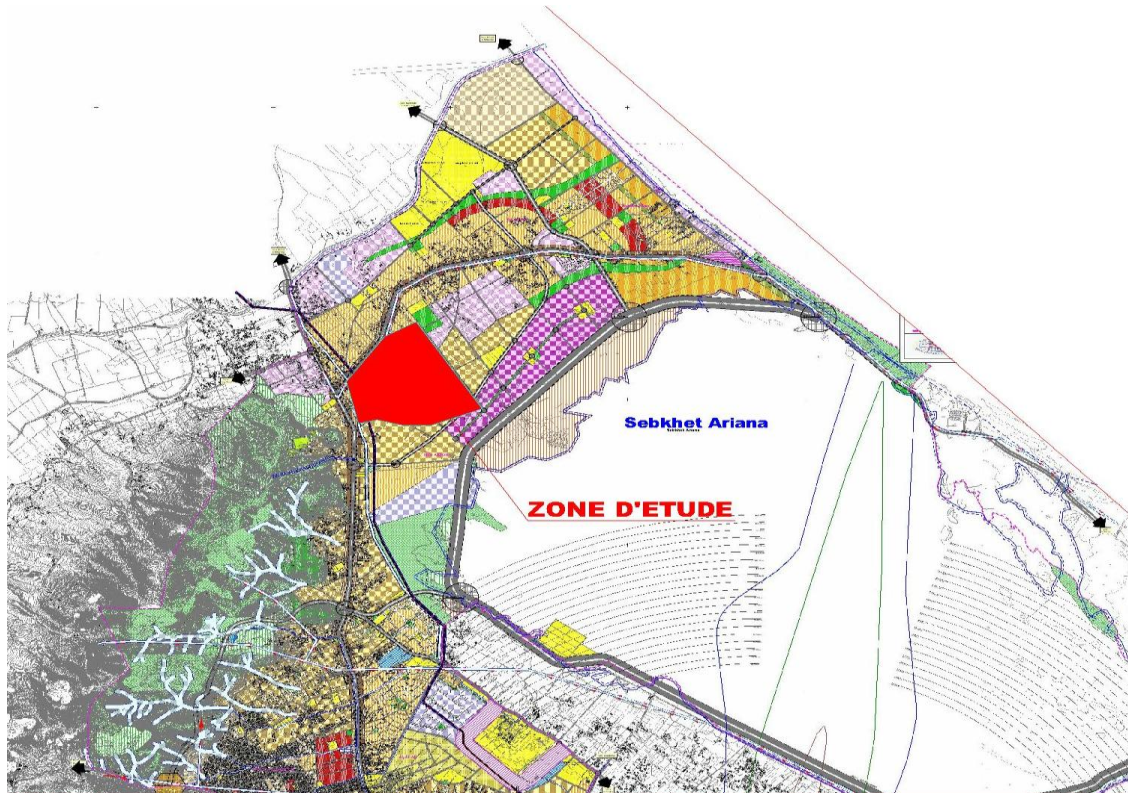

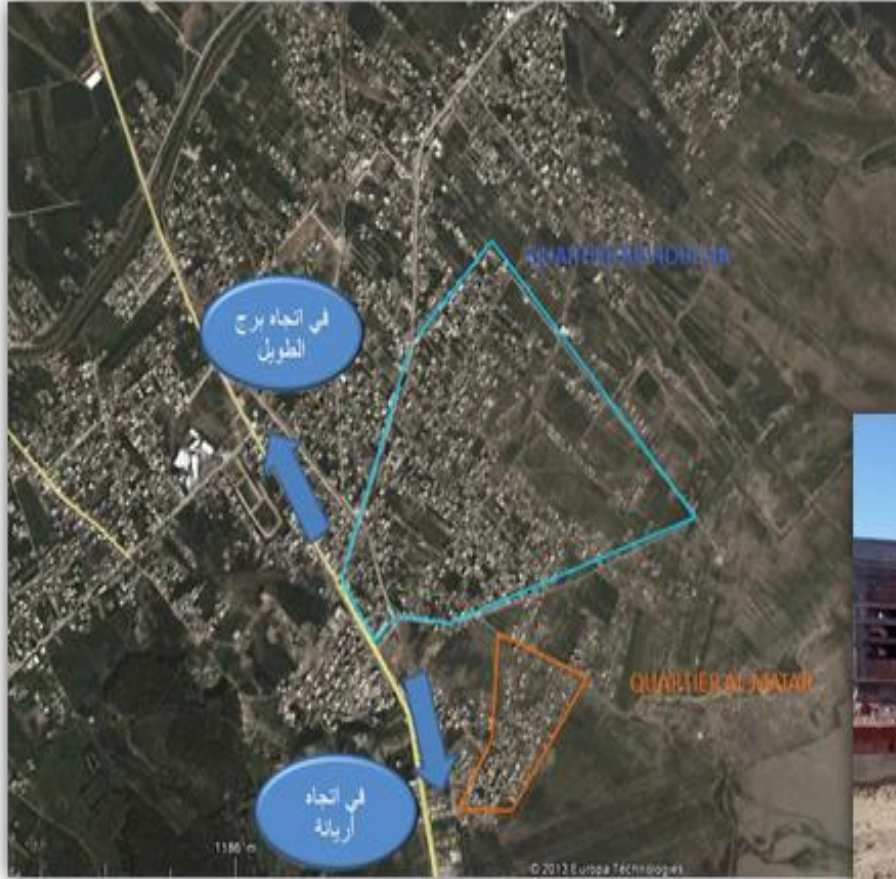

*في طور إنجاز تجهيزات جماعية بمنطقة
البراحة متمثلة في مشروع بناء مركب ثقافي و
رياضي ضمن مشروع تهذيب حي عينوثية و حي
المطار بكلفة 1.600.000 د المدرج ببرنامج
تهذيب و إلماج الأحياء السكنية عن طريق وكالة
التهذيب و التجديد العمراني كصاحب متشأ مفوض
لقائدة بلدية رواد.



مستخرج من موقع Google Earth يبين منطقة التدخل



I. مشروع تهذيب منطقة جعفر حي السليمانية و حي العبادلة:

- الكلفة: 7.580.000 د (يشمل التدخل لطرق، التنوير العمومي، الربط بمختلف الشبكات ، تحسين السكن و إنجاز تجهيزات جماعية)
- مدة الإنجاز: 542 يوما.
- نسبة الإنجاز: 100% لنسبة للتدخل لطرق و قد تم القبول النهائي للأشغال.
- 97% لنسبة للتجهيزات الجماعية.
- الموقع:



مستخرج من موقع Google Earth يبين منطقة التدخل



*تم إنجاز تجهيزات جماعية متمثلة في مشروع بناء محل صناعي و قاعة رياضات فردية و ملعب حي بجعفر ضمن مشروع تهذيب أحياء السليمانية و العبادلة المدرج بالبرنامج الإضافي للإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى عن طريق وكالة التهذيب و التجديد العمراني كصاحب منشأ مفوض لفائدة بلدية رواد و قد تم القبول النهائي للأشغال و تسليم الملعب و المحل الصناعي لبلدية رواد.



أما أشغال بناء قاعة الرياضات الفردية فهي في طور الإنجاز بنسبة 97%.



البر مج الإضافي للإحاطة لأحياء الشعبية

I. مشروع تهذيب حي الأمل و حي النصر:

- الكلفة: 1.941.257 د (يتمثل التدخل لطرقات، التنوير العمومي و الربط بمختلف الشبكات)
- مدة الإنجاز: 365 يوما.
- نسبة الإنجاز: 70 %





• الموقع:



مستخرج من Google Earth يبين منطقة التدخل




مستخرج من Google Earth يبين منطقة التدخل



البرمج الخصوصي لتهديب الأحياء الشعبية لحد من التفاوت الجهوي

I. مشروع تهديب حي الأمل و حي النصر (تكملة):

- الكلفة: 563.149 أ.د (يشمل التدخل لطرق، التنوير العمومي و الربط بمختلف الشبكات)
- نسبة الإنجاز: 75 %
- الموقع:

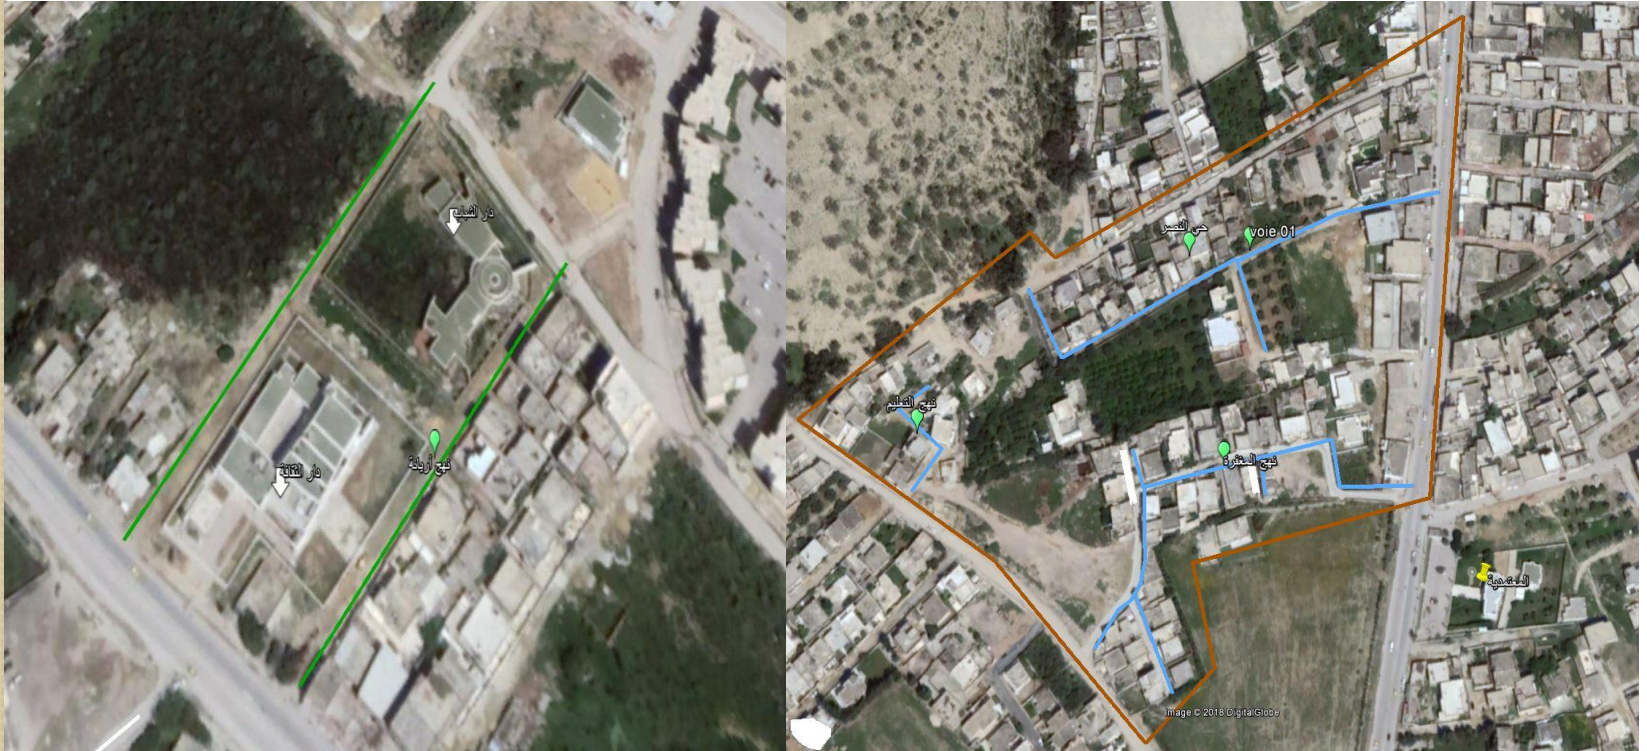

مستخرج من Google Earth يبين منطقة التدخل



I. مشروع تهذيب حي البرارحة:


- الكلفة: 2374.500 أ.د (يشمل التدخل لطرق، التنوير العمومي و الربط بمختلف الشبكات)
- نسبة الإنجاز: 20% .
- الموقع:

مستخرج من موقع Google Earth يبين منطقة التدخل



I. مشروع تهذيب حي سيدي عمر:

- المبلغ المرصود: 2.000.000 د (يشمل التدخل لطرقات، التنوير العمومي و الربط بمختلف الشبكات)
- نسبة الإنجاز: في طور الدراسات التفصيلية.
- الموقع:

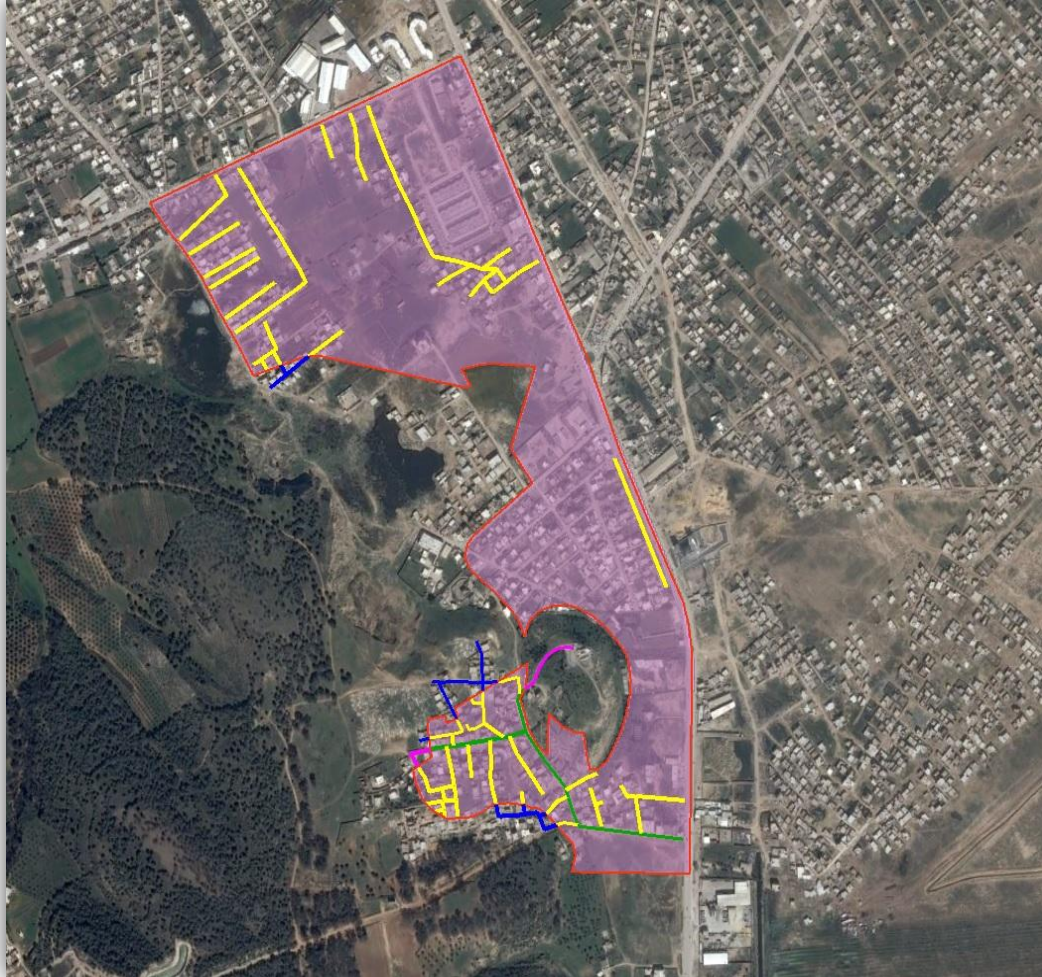

مستخرج من موقع Google Earth يبين منطقة التدخل



برمج المجلس الجهوي للتنمية

المجلس الجهوي لولاية أريانة إعلان استشارة عدد 2017/04 إعداد الدراسة الأولية لمشروع تهذيب حي شاكر وحي وردة بمعمدية رواد

تعزّم السيدة والية أريانة رئيسة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بها القيام باستشارة لانجاز الدراسة الأولية لمشروع تهذيب حي شاكر وحي وردة بمعمدية رواد ضمن برنامج تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي لسنة 2017.

فعلى مكاتب الدراسات صنف أ 1 وأ 2 وأ 3 وب 2 والمهندسين المستشارين اختصاص هندسة مدنية الراغبين في المشاركة سحب ملفات الاستشارة من مكتب الضبط المركزي بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بأريانة الكائن مقرها بالحي الإداري 2080 أريانة.

يجب أن تحمل العروض عبارة: لايفتح، استشارة عدد 2017/04 لانجاز الدراسة الأولية لمشروع تهذيب حي شاكر وحي وردة بمعمدية رواد ضمن برنامج تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي لسنة 2017.

ترسل العروض في ظرف خارجي عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي بولاية أريانة مقابل وصل تسليم باسم السيدة والية أريانة

ملاحظة: يلغى كل عرض يرد بعد الأجل القانونية

حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم الجمعة 19 ماي 2017 ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ وصول العروض إلى مكتب الضبط المركزي بولاية أريانة.

I. مشروع تهذيب حي شاكر:

- الكلفة:أ.د (يشمل التدخل لطرقات، التنوير العمومي و الربط بمختلف الشبكات)

- مرحلة الإنجاز: في طور الدراسة من طرف مكتب الدراسات

II. مشروع تهذيب حي وردة:

- الكلفة:أ.د (يشمل التدخل لطرقات،

التنوير العمومي و الربط بمختلف الشبكات)

- نسبة الإنجاز: في طور الدراسة من طرف مكتب الدراسات

مشاريع مشتركة مع الوزارات



مشروع بناء دار الثقافة و دار الشباب بجعفر

I. مشروع بناء دار الشباب بجعفر:

- الكلفة: 900.000 د (تم البناء بكلفة 500 أ.د و في طور إنجاز أشغال التهيئة الخارجية بكلفة 400 أ.د)
- نسبة الإنجاز: 95%.





I. مشروع بناء دار الثقافة بجعفر:

- الكلفة: 2.350.000 د
- نسبة الإنجاز: 100% (في طور القبول الوقتي للأشغال).



مستخرج من موقع Google Earth يبين موقع البناء



مشاريع التطهير في طور الانجاز



| المشروع | الكلفة | تقدم الانجاز |
|---|-----------------------|-----------------|
| تحويل المياه المعالجة لمحطات التطهير نحو حوض التجميع و التعديل و منه إلى البحر | | |
| أشغال مد قنوات قطر 1800م بطول 2.2 كلم | 127 مليون دينار | %60 |
| انجاز حوض تجميع و تعديل المياه بسعة 160 ألف متر مكعب | | |
| انجاز و تجهيز محطة ضخ بمنسوب 3 متر مكعب / الثانية و مد قنوات قطر 1600م بطول 4200 متر خطي | | |
| أشغال انجاز المصرف البحري:مد قنوات قطر 1600م بطول 6 كلم | | |









| تاريخ بداية الانجاز | الكلفة | المشروع |
|--------------------------|----------------|--|
| الثلاثية الرابعة 2017 | 52 مليون دينار | تعويض القنال الترابي لقنال الخليج بقنوات قطر 2000 مم على طول 4 كلم |





| المشروع | الكلفة | تاريخ بداية الانجاز |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| توسيع الشبكة الثانوية للتطهير برواد | 2 مليون دينار | سنة 2019 |
| توسيع شبكة التطهير بحي شاکر | 2 مليون دينار | سنة 2019 |



ولاية أريانة بلدية رواد متابعة المشاريع التي في طور الإنجاز

الجمهورية التونسية
ولاية أريانة
بلدية رواد
مصلحة الدراسات و متابعة المشاريع
19/10/2018

1- مشاريع ممولة من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية:

1.1- مشاريع في مرحلة تحويل الإعتمادات:

| الولاية | البلدية | المشروع | الكلفة المصادق عليها (أ.د.) | تاريخ المصادقة النهائية | نسبة الإنجاز (%) العالي (%) | تاريخ آخر تحويل | نسبة الإنجاز المادي (%) | التاريخ المتوقع لتقديم طلب تحويل اعتمادات | التاريخ المتوقع لختم الملف | الملاحظات (مع بيان بقية مراحل و رزنامة تنفيذ المشروع) |
|---------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---|----------------------------|---|
| أريانة | رواد | تعبيد الطرقات برنامج 2009. | 770,926 | 25/12/2009 | 86% | 02/12/2011 | 100% | | | بصدد التسوية. |
| أريانة | رواد | تهيئة مسلخ بلدي (قسط 1) دراسة | 26,220 | 13/07/2014 | 74% | 12/07/2016 | 100% | | | تم إنجاز الدراسات. |
| أريانة | رواد | تهيئة مسلخ بلدي | 533,780 | 01/06/2011 | 0% | | | | | سيتم إنجاز مسلخ مشترك بين بلديات رواد و سكرة و أريانة. المشروع في مرحلة توفير اعتمادات بقيمة 2 مليون دينار. |
| أريانة | رواد | تعبيد الطرقات و مد الأرصفة | 1 526,448 | 05/08/2013 | 86% | 16/04/2015 | 100% | | | بصدد التسوية. |
| أريانة | رواد | تعبيد الطرقات برنامج 2013 | 1 065,930 | 07/04/2015 | 100% | 06/06/2016 | 100% | | | تم القبول النهائي للأشغال، في طور ختم الصفحة. |



2- مشاريع ممولة بالكامل من طرف البلديات بواسطة التمويل الذاتي و/ أو المساعدة غير الموظفة:

| الولاية | البلدية | المشروع | الكلفة (د.) | سنة البرمجة | نسبة الإنجاز المادي (%) | الملاحظات (مع بيان رزنامة تنفيذ المشروع) |
|---------|---------|--|-------------|-------------|-------------------------|---|
| أريانة | رواد | تعميد وصيانة الطرقات برنامج 2016 | 1 727,000 | 2016 | 100% | تم القبول الوتقي للأشغال |
| أريانة | رواد | تعميد وصيانة الطرقات برنامج 2016 | 1 274,000 | 2016 | 100% | تم القبول الوتقي للأشغال. |
| أريانة | رواد | تعميد وصيانة الطرقات برنامج 2017 | 2 681,000 | 2017 | 5% | انطلقت الأشغال بتاريخ 24 سبتمبر 2018 |
| أريانة | رواد | تعميد وصيانة الطرقات برنامج 2018 | 2 600,000 | 2018 | — | في طور الإعلان عن طلب العروض |
| أريانة | رواد | بناء مقر القضاة البلدية و مصلحة المعالم و الإستخلاصات. | 400,000 | 2018 | — | تم الاستقواء عن التوسعة و سيتم إنجاز أشغال إعادة تهيئة مع التقليل في المبالغ المرصودة الي 120 أذ |
| أريانة | رواد | الإتارة العمومية: نقاط ضوئية جديدة | 100,000 | 2018 | 100% | تم القبول الوتقي للأشغال. |
| أريانة | رواد | صيانة شبكة التوزيع العمومي لسنة 2018 | 140,000 | 2018 | 70% | في طور الإنجاز. |
| أريانة | رواد | الاتارة العمومية: نقاط ضوئية جديدة | 59,000 | 2017 | 100% | تم القبول الوتقي للأشغال. |
| أريانة | رواد | تهيئة المستودع البلدي. | 1 141,000 | 2016 | 100% | تم القبول النهائي للأشغال. |
| أريانة | رواد | تهيئة مستودع الحجز البلدي. | 146,000 | 2016 | 100% | تم القبول النهائي للأشغال |
| أريانة | رواد | دراسة مثال مروري لبلدية رواد | 56,000 | 2015 | 15% | انطلقت الدراسات. |
| أريانة | رواد | صيانة شبكة التوزيع العمومي لسنة 2017 | 80,000 | 2017 | 100% | تم القبول الوتقي للأشغال. |
| أريانة | رواد | تحديد حرمة الطرقات المرصحة بمثال التهيئة المرانية Bellsage | 30,000 | 2017 | — | تم إلغاء الإن بالتزود لإنجاز الأشغال لتراجع المقاول عن القيام بالأشغال. سيتم إعادة الإستشارة في القرب الأجل. |
| أريانة | رواد | صيانة المسلخ البلدي | 80,000 | 2017 | — | تم تأجيل الإنجاز للحصول على اعتمادات إضافية |
| أريانة | رواد | تهيئة ساحة الوفاء | 139,000 | 2016 | 100% | تم تسخ العقد مع المقاول. |
| أريانة | رواد | صيانة ساحة الوفاء | 13,800 | 2018 | — | سيتم الانطلاق في أشغال رفع الاملاات المتعلقة بالاستشارة |
| أريانة | رواد | تهيئة مقبرة سيدي عسر | 258,000 | 2016 | 70% | في طور الإنجاز. |
| أريانة | رواد | اقتناء مواد مقاطع و مواد بناء | 67,000 | 2017 | 100% | تم الإنجاز |
| أريانة | رواد | اقتناء مواد مقاطع | 50,000 | 2018 | — | في طور الترخ |
| أريانة | رواد | الصيانة الموضعية للطرقات | 150,000 | 2018 | — | في طور الفرز الفني |
| أريانة | رواد | تعميد نهج رواد | 59,000 | 2017 | 100% | تم القبول النهائي للأشغال. |
| أريانة | رواد | جهر شبكة تصريف مياه الأمطار | 50,000 | 2018 | 10% | انطلقت الأشغال |
| أريانة | رواد | تعهد شبكة تصريف مياه الأمطار | 150,000 | 2018 | — | بصدد إعداد الإستشارة |



3- مشاريع مشتركة مع الوزارات :

| الولاية البلدية | المشروع | الكلفة (أ.د.) | سنة البرمجة | نسبة الإنجاز المادي (%) | الملاحظات (مع بيان رزمة تنفيذ المشروع) |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------------|---|
| أريانة رواد | برنامج تصبير الطرقات | 3 000,000 | 2017 | 100% | انتهت أشغال القسط الأول و تم القبول الوتقي في انتظار توفر اعتمادات للقسط الثاني |
| أريانة رواد | نادي أطفال حي البريجة | 353,000 | 2011 | 0% | تم فتح العروض بتاريخ 17/10/2018. |
| أريانة رواد | ملعب بلدي حي البريجة | 1 450,000 | 2006 | - | بصدد فتح ترشحات الهندسة المعمارية بعد تسلم الملف من وزارة |
| أريانة رواد | دار الشباب بجعفر | 900,000 | 2012 | 95% | في طور إنجاز التهيئة الخارجية و السياج. |
| أريانة رواد | دار الثقافة بجعفر | 2 350,000 | 2011 | 99% | في طور القبول الوتقي للأشغال. |

4- مشاريع التهذيب المدرجة ضمن برنامج تهذيب و إدماج الأحياء السكنية :

| الولاية البلدية | المشروع | الكلفة (أ.د.) | سنة البرمجة | نسبة الإنجاز المادي (%) | الملاحظات (مع بيان رزمة تنفيذ المشروع) |
|-----------------|---|---------------|-------------|----------------------------|---|
| أريانة رواد | تهذيب منطقة عشوشة المطار. | 9 800,000 | 2014 | 87% | تم فسخ الصفقة مع المقاوله بصدد اتمام اجراءات الفسخ |
| أريانة رواد | إنجاز تجهيزات جماعة عشوشة. | | 2014 | 60% | في طور إنجاز تجهيزات جماعة بمنطقة البريجة (مركب ثقافي و رياضي و فضاء إقتصادي). |
| أريانة رواد | تهذيب منطقة جعفر (تهذيب حي السلمانية و العائلة) | 7 580,000 | 2014 | 100% | تم القبول النهائي للأشغال. |
| أريانة رواد | إنجاز تجهيزات جماعة بجعفر. | | 2014 | 97% | *تم إنجاز ملعب حي و هو في طور الإستغلال *تم إنجاز فضاء صناعي و هو في طور الإستغلال *و في طور فسخ الصفقة مع المقاوله المكلفة بإنجاز قاعة رياضة |

5- مشاريع التهذيب المدرجة ضمن البرنامج الإضافي للإحاطة بالأحياء الشعبية :

| الولاية البلدية | المشروع | الكلفة (أ.د.) | سنة البرمجة | نسبة الإنجاز المادي (%) | الملاحظات (مع بيان رزمة تنفيذ المشروع) |
|-----------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------------|--|
| أريانة رواد | تهذيب حي الأمل و حي النصر | 1 941,257 | 2015 | 70% | في طور الإنجاز. |

6- مشاريع التهذيب المدرجة ضمن البرنامج الخاصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي :

| الولاية البلدية | المشروع | الكلفة (أ.د.) | سنة البرمجة | نسبة الإنجاز المادي (%) | الملاحظات (مع بيان رزمة تنفيذ المشروع) |
|-----------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|--|
| أريانة رواد | تهذيب حي سيدي عمر | 2 000,000 | 2018 | - | تم الإنطلاق في الدراسات التفصيلية. |
| أريانة رواد | تهذيب حي شاكروحي وردة | 3 000,000 | 2017 | - | في طور الدراسة |
| أريانة رواد | تهذيب حي الأمل وحي النصر (تكملة) | 563,149 | 2016 | 75% | في طور الإنجاز تم استئناف الأشغال بتاريخ 22/06/2018 |
| أريانة رواد | تهذيب حي البريجة (*) | 2 374,500 | 2016 | 20% | بصدد مد شبكة الغاز الطبيعي و الإنطلاق في تغيير قنوات شبكة الماء الصالح للشرب |




تقسيم المناطق

- المنطقة الأولى :منطقة الغزالة
- المنطقة الثانية :منطقة جعفر
- المنطقة الثالثة :منطقة سيدي عمر
- المنطقة الرابعة :منطقة النخيلات
- المنطقة الخامسة :منطقة أريانة الصغرى
- المنطقة السادسة :منطقة رواد الشاطئ



المنطقة الأولى: منطقة الغزالة

منطقة الغزالة

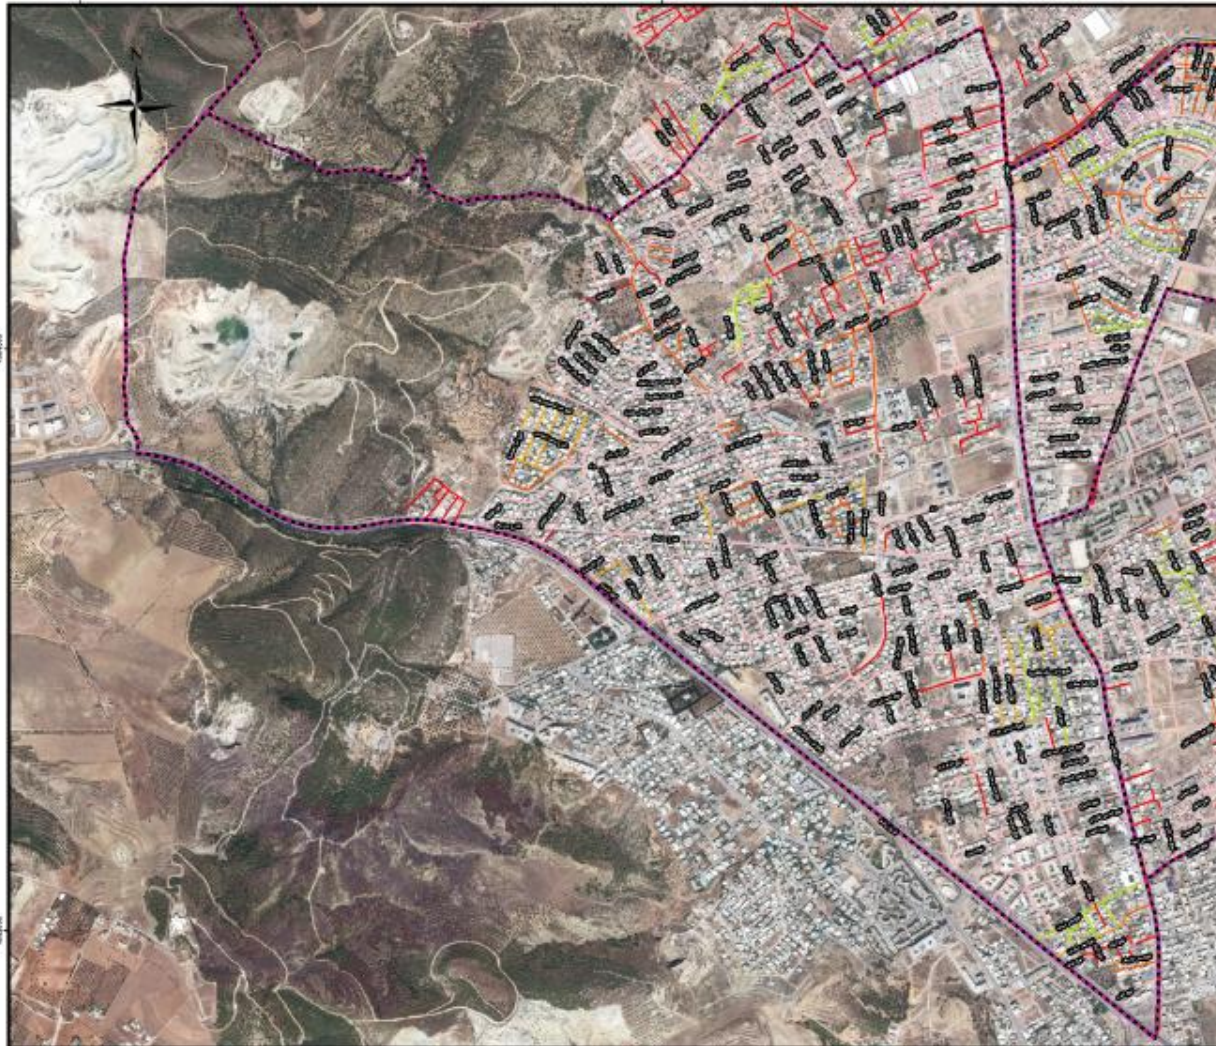

اعداد حسام بن سويسي و حاتم راشد



المنطقة الثانية: منطقة جعفر

منطقة جعفر



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية راود

حالة الطريق


- حالة جيدة
- برنامج 2018
- تهيبة الاحياء الشعبة
- اشغال جديدة
- في طور الانجاز
- حالة متوسطة
- حالة سيئة
- حدود المنطقة

اعداد حسام بن سويبي و حسام راوند



المنطقة الثالثة: منطقة سيدي عمر

منطقة سيدي عمر

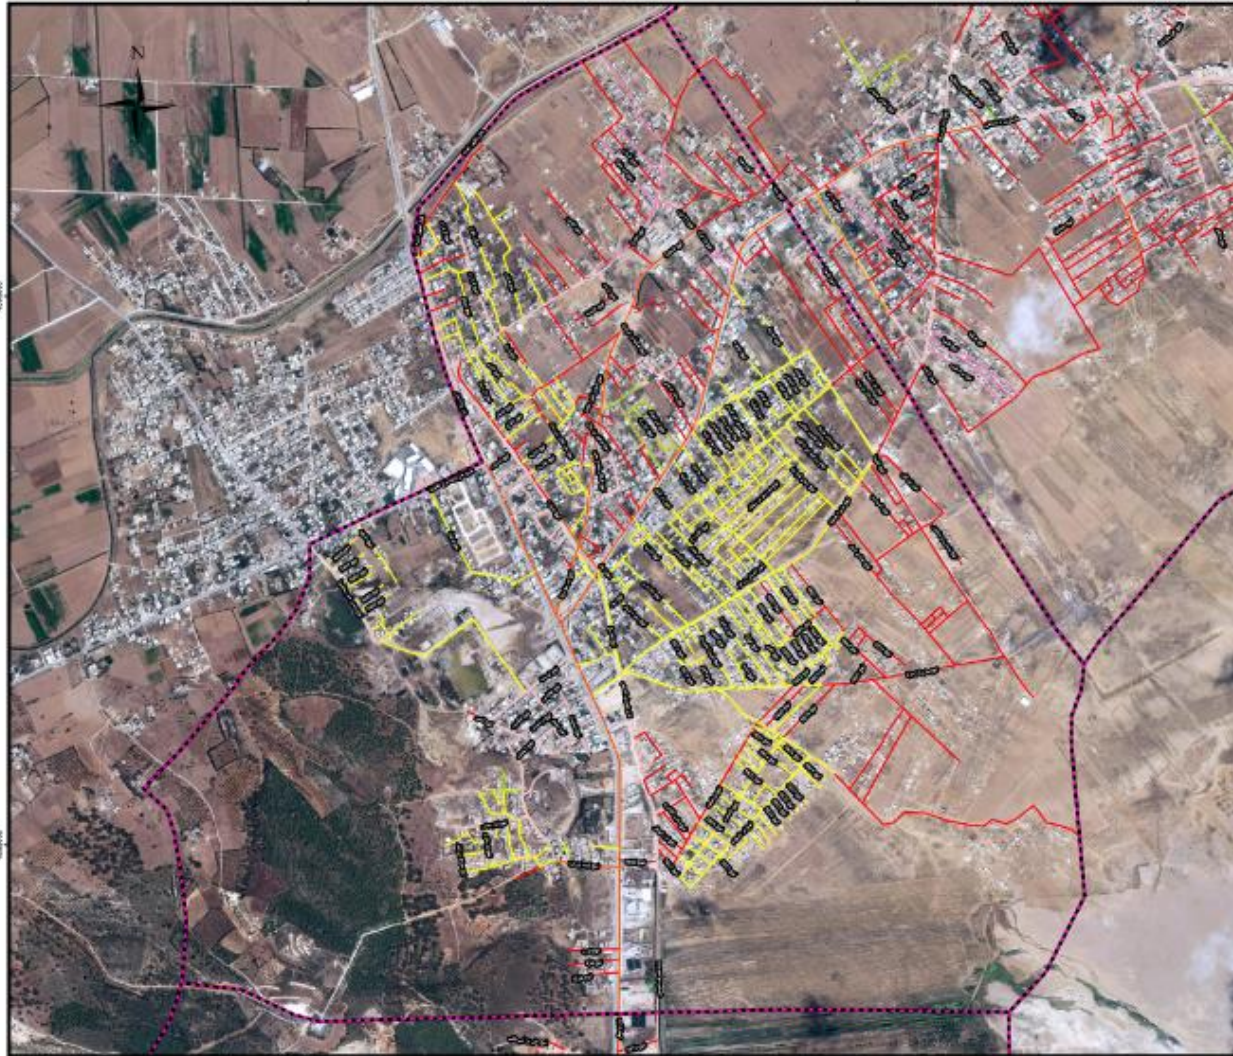

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية رواد

حالة الطريق

- حالة جيدة
- برنامج 2018
- تهيئة الاحياء الشعبية
- اشغال جديدة
- في طور الانجاز
- حالة متوسطة
- حالة سيئة
- حدود المنطقة



المنطقة الرابعة: منطقة النخيلات

منطقة النخيلات



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية راود



اعداد حسام بن سويبي و حسام رائد



المنطقة الخامسة: منطقة اريانة الصغرى

منطقة اريانة الصغرى



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية راود

حالة الطريق

- حالة جيدة
- برنامج 2018
- تهييب الاحياء الشعبية
- اشغال جديدة
- في طور الاتجاز
- حالة متوسطة
- حالة سيئة
- حدود المنطقة



المنطقة السادسة: منطقة رواد الشاطئ

منطقة رواد الشاطئ



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية راود

حالة الطريق

- حالة جيدة
- برنامج 2018
- تهذيب الأحياء الشعبية
- اشغال جديدة
- في طور الانجاز
- حالة متوسطة
- حالة سيئة
- حدود المنطقة



اعداد حسام بن سويقتي و حسام راشد



بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات و الأرصفة والتنوير العمومي و الربط بشبكة التطهير حسب المناطق



الطرق و الأرصفة

| الأرصفة | | الطرق | | | المناطق |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| نسبة الأرصفة غير المبلطة وفي حالة سيئة % | نسبة الأرصفة في حالة جيدة او متوسطة % | نسبة الطرق غير المعبدة % | نسبة الطرق في حالة جيدة او في البرنامج % | نسبة الطرق في حالة سيئة او متوسطة % | |
| 35 | 65 | 5 | 75 | 20 | منطقة الغزالة |
| 15 | 85 | 00 | 50 | 50 | منطقة اريانة الصغرى |
| 97 | 3 | 75 | 20 | 5 | منطقة رواد |
| 58 | 42 | 20 | 65 | 15 | منطقة النخيلات |
| 77 | 23 | 40 | 50 | 10 | منطقة سيدي عمر |
| 73 | 27 | 40 | 55 | 5 | منطقة جعفر |
| 60 | 40 | 30 | 52.5 | 17.5 | المعدل العام |



التنوير العمومي ببلدية رواد

| المناطق | نسبة التغطية % |
|----------------------|----------------|
| منطقة الغزالة | 95 |
| منطقة أريانة الصغرى | 95 |
| منطقة رواد | 65 |
| منطقة النخيلات | 90 |
| منطقة سيدي عمر | 71 |
| منطقة جعفر | 86 |
| كامل المنطقة البلدية | 83.66 |



نسبة الربط بقنوات التطهير ببلدية رواد

| المناطق | نسبة التغطية % |
|----------------------|----------------|
| منطقة الغزالة | 100 |
| منطقة أريانة الصغرى | 100 |
| منطقة رواد | 00 |
| منطقة النخيلات | 100 |
| منطقة سيدي عمر | 51 |
| منطقة جعفر | 66 |
| كامل المنطقة البلدية | 69.5 |
